# CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **DURATA LAVORI** | **1270 g** |
| 2 | Demolizioni e scavi | 50 g |
| 3 | **Piano interrato -2** | **680 g** |
| 4 | Opere strutturali | 80 g |
| 5 | Opere edili | 130 g |
| 6 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 7 | Opere di finitura | 70 g |
| 8 | **Piano interrato -1** | **600 g** |
| 9 | Opere strutturali | 80 g |
| 10 | Opere edili | 130 g |
| 11 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 12 | Opere di finitura | 70 g |
| 13 | **Piano terra** | **650 g** |
| 14 | Opere strutturali | 80 g |
| 15 | Opere edili | 130 g |
| 16 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 17 | Opere di finitura | 70 g |
| 18 | **Piano primo** | **570 g** |
| 19 | Opere strutturali | 80 g |
| 20 | Opere edili | 130 g |
| 21 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 22 | Opere di finitura | 70 g |
| 23 | **Piano secondo** | **620 g** |
| 24 | Opere strutturali | 80 g |
| 25 | Opere edili | 130 g |
| 26 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 27 | Opere di finitura | 70 g |
| 28 | **Piano terzo** | **540 g** |
| 29 | Opere strutturali | 80 g |
| 30 | Opere edili | 130 g |
| 31 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 32 | Opere di finitura | 70 g |
| 33 | **Piano quarto** | **590 g** |
| 34 | Opere strutturali | 80 g |
| 35 | Opere edili | 130 g |
| 36 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 37 | Opere di finitura | 70 g |
| 38 | **Piano quinto** | **510 g** |
| 39 | Opere strutturali | 80 g |
| 40 | Opere edili | 130 g |
| 41 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 42 | Opere di finitura | 70 g |
| 43 | **Piano sesto** | **560 g** |
| 44 | Opere strutturali | 80 g |
| 45 | Opere edili | 130 g |
| 46 | Opere impiantistiche | 70 g |
| 47 | Opere di finitura | 70 g |
| 48 | **Sistemazione esterna** | **50 g** |
| 49 | Aree pavimentate | 50 g |
| 50 | Aree verdi | 50 g |

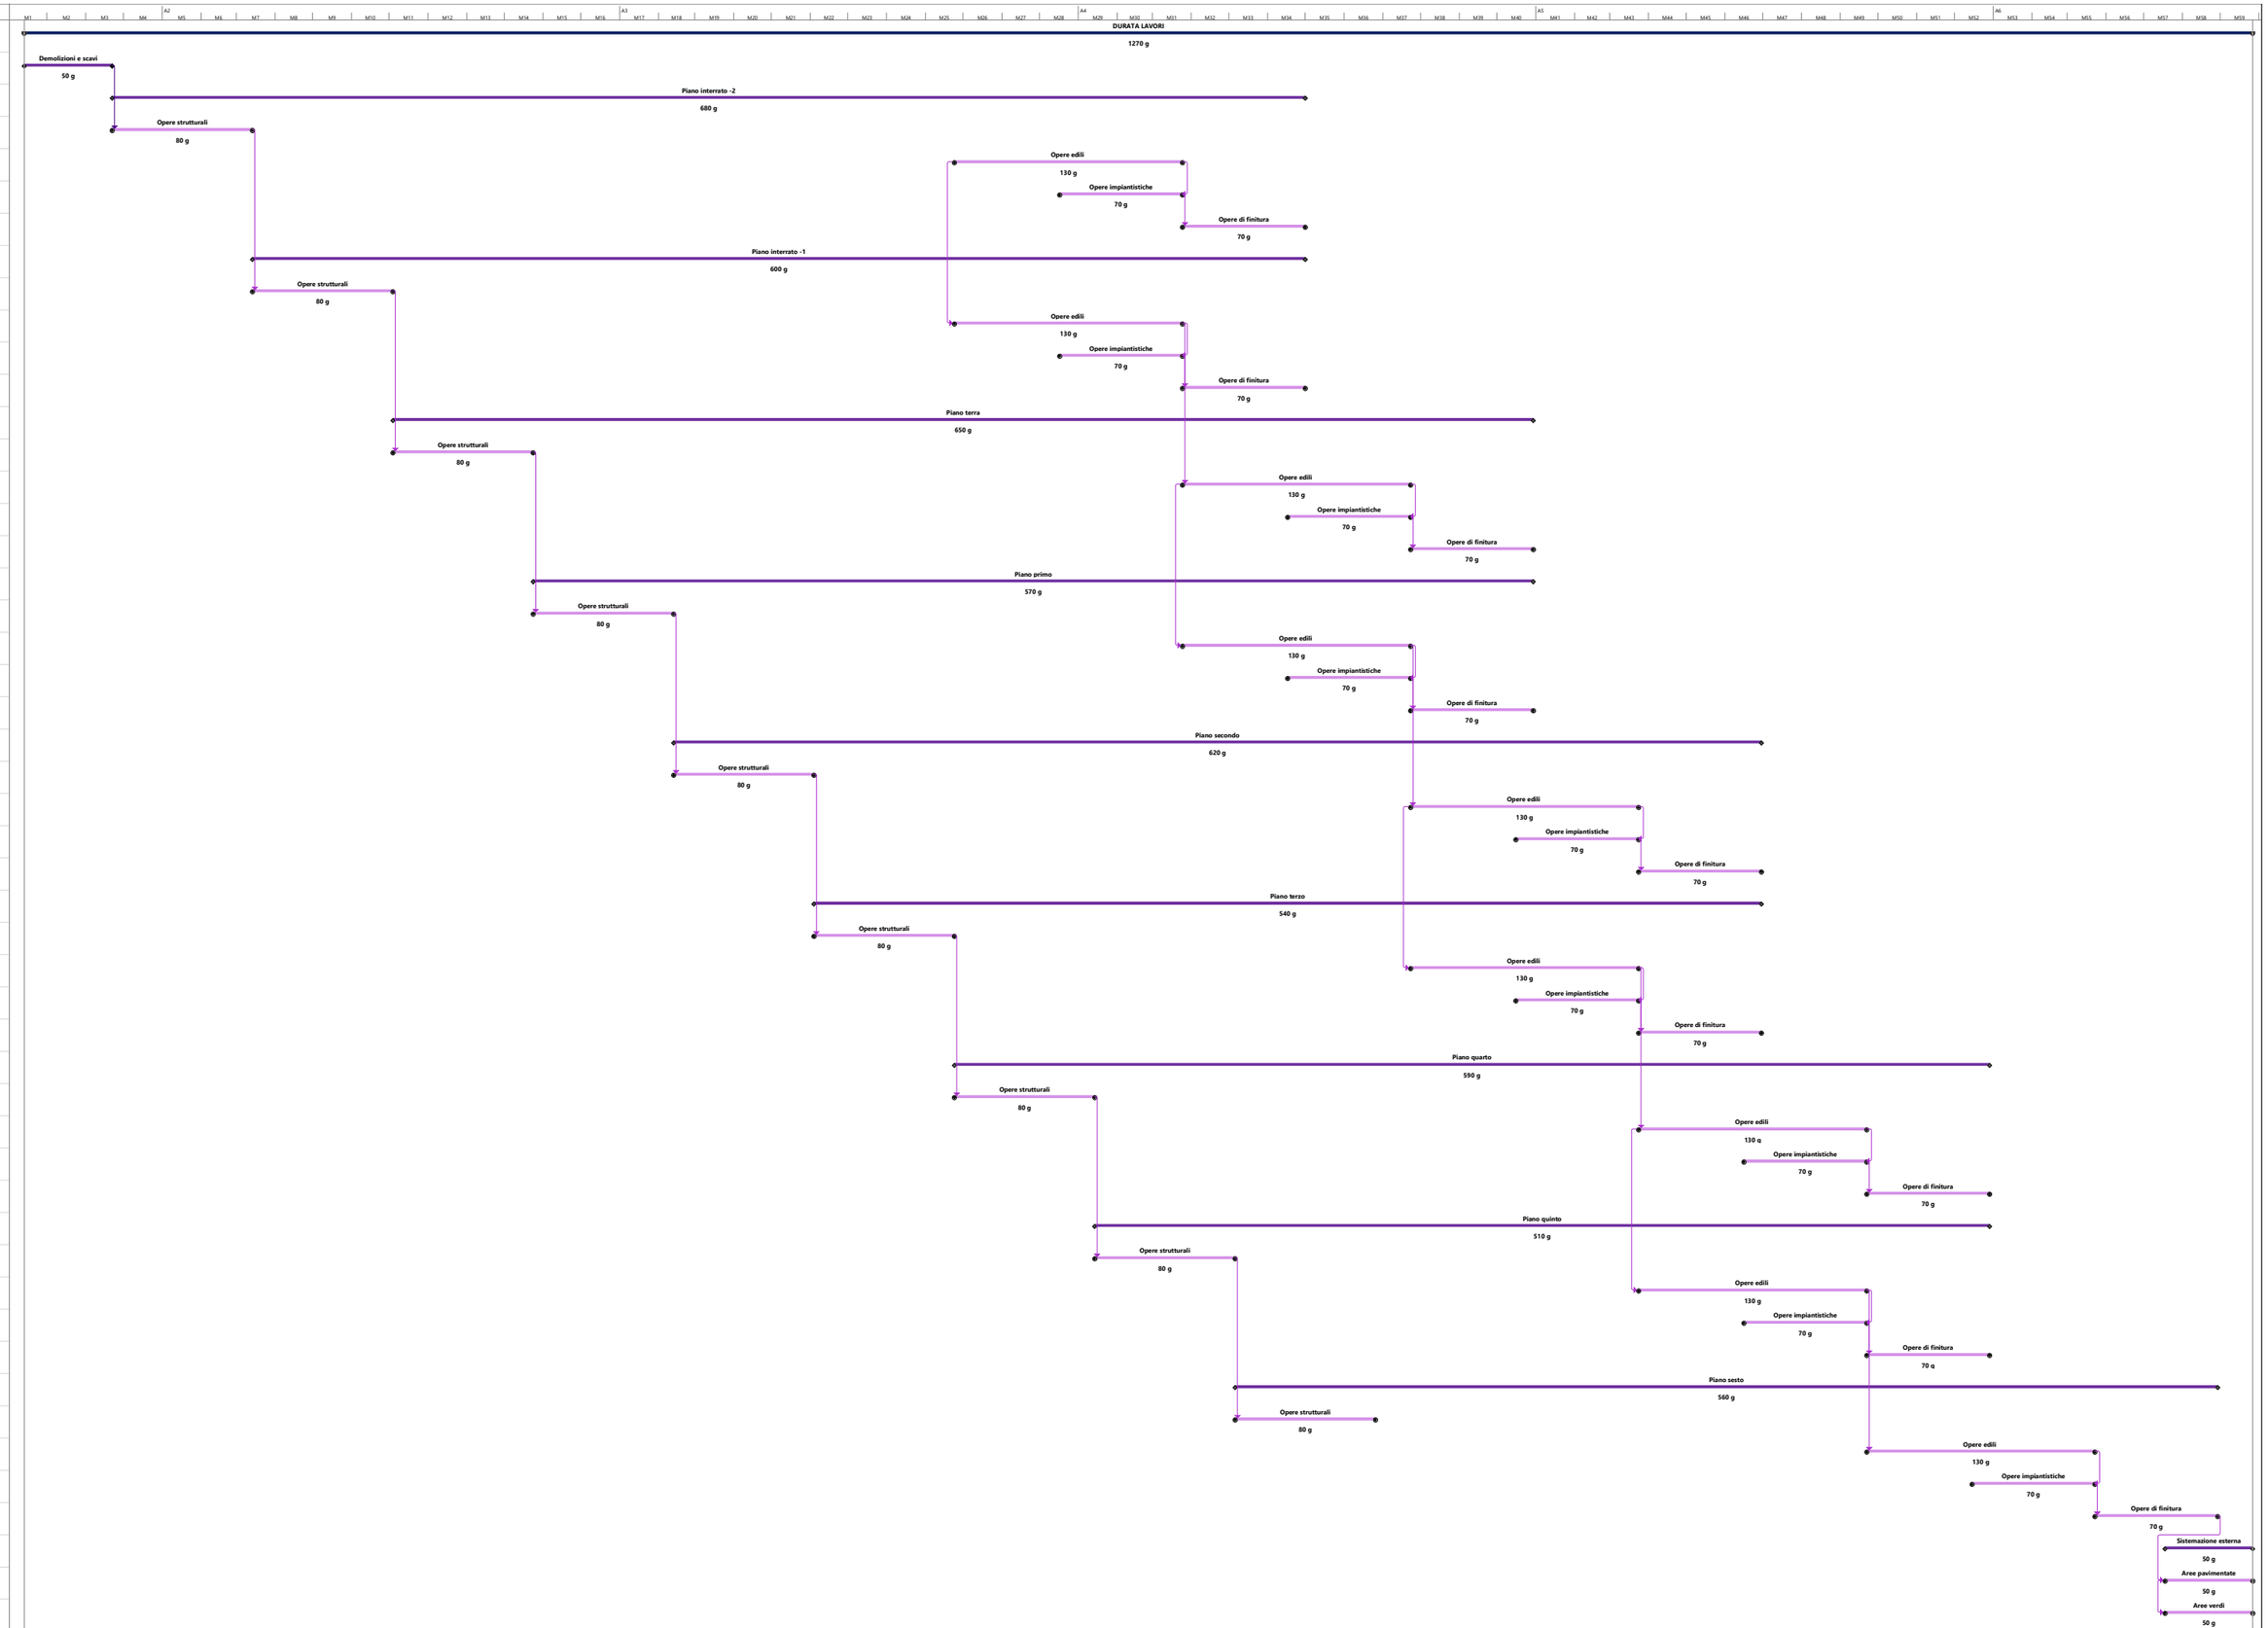


Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo fine · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza · Avanzamento · Avanzamento manuale
